

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

04 / SEPT. / 2023

FOLIO

001

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: PALENQUE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-009/2023

FONDO: FAISMUN

PROGRAMA: URBANIZACION

SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS

NOTA 01.

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA REGISTRO DE LAS NOTAS RELEVANTES RELACIONADAS CON LA OBRA DENOMINADA "MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE" SE DIERON CITA EN EL LOCAL DE LA OBRA AL C. VALERIO SALVADOR Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, EN SU ENCAPTE DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. ASI MISMO AL C. ROBERTO MARTINEZ S., EN SU ENCAPTE DE PRESIDENTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS ACUERDOS PARA LLEVAR ACABO LA OBRA NEGROU A LA MEDALLON DE ADMINISTRACION DIRECTA.

EN SU PARTICIPACION EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ANUNCIA LA INVERSION PROGRAMADA PARA ESTA OBRA SIENDO ESTA LA CANTIDAD DE \$163,408.00 CON UN META DE CONCLUIR EL MANTENIMIENTO DE CAMINO, TOTALMENTE FUNCIONAL.

A SU VEZ, EL PRESIDENTE MUNICIPAL INVITA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA Y A LA COMUNIDAD ENTERA DE PALENQUE A ORGANIZARSE PARA QUE ADENAS DEL BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA, PUEDAN SER QUIENES REALICEN LOS TRABAJOS DESDE LOS PRINCIPALES HASTA SU CONCLUSION.

UNA VEZ DADA SU INTERVENCIÓN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIVA HACEN EL RECONOCIMIENTO DEL TERRENO Y CON LA AYUDA DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA. POSTERIORMENTE CON EL BANDO PAZO DE AVANQUE DE DICHA OBRA SIENDO LAS 10:15 HRS. DE ESTA MISMA FECHA, ESTANDO PRESENTE EN EL SITIO YA EL PERSONAL ASIGNADO, NI COMO LA HERRAMIENTA NECESARIA.

AL CUMPLIR DE LA PRESENTE NOTA, QUEDA ASIGNADA QUE LAS PERSONAS INDICADAS PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE LAS ANOTACIONES EN LA PRESENTE BITACORA SON LOS CC. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y EL C. LEONEL SANCHEZ CRUZ, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE. MENCIONANDO QUE LAS NOTAS DEBERAN SER CORTAS Y EXCLUSIVAMENTE RELATIVAS A LA OBRA QUE SE EJECUTARA.

QUEDA ESTABLECIDO, DE KUAL FORMA QUE LA BITACORA DEBERA REPORTARSE DIARIAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO.

DANDO INICIO A LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. ASI MISMO INICIAN CON LA EXCAVACION A UNO 4/6 UTILIZANDO EQUIPOS MECANICOS PARA EL DESPUNTE DE ESTRUCTURAS.

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO



C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



C. VALERIO SALVADOR ANTONSO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO MARTINEZ SANCHEZ
PRESIDENTE COMITE PARTICIPACION SOCIAL

04/09/2023 - 31/12/2025
NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

08 / SEPT. / 2023

FOLIO

002

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: PALENQUE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-009/2023

FONDO: FAISMUN

PROGRAMA: URBANIZACION

SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS

Nota 02.

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES EL RECURSO TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO, UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL, DONDE SE TENDERA EL TUBO CORUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 36" DE DIAMETRO. EN EL PROCESO DE EXCAVACION SE ENCUENTRAN CON MATERIAL OPCORAS DE MAYOR DIMENSION, POR LO QUE SE TIENE QUE RECURRIR A UN ROTOMARTILLO PARA SU DEMOLICION, UTILIZANDO UNA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA PODER CONTINUAR CON LA EXCAVACION.


SE VERIFICAN LOS NIVELES DE EXCAVACION O PROFUNDIDAD DE LA CERRA, TOMANDO CUENTA EL NIVEL DE REFERENCIA, ESTACAS O UN CAUCETAS.

C. GONZALO SANCHEZ CIVIL
RESPONSABLE TECNICO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Oax. Tehuantepec, Oax.

G. VALERIO SANCHEZ MONTECINO
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIUNIA DE
OBSAS

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIOL DE OBRAS PUBLICAS
Santa María
Guienagati,
Oax. Tehuantepec, Oax.
08/11/2023 - 31/12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

14 / SEPT. / 2023

FOLIO

003

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-009/2023

LOCALIDAD: PALENQUE

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS

NOTA 03.

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.


CON ESTA FECHA, SE OBSERVA QUE LOS TRABAJADORES CONTINUAN REALIZANDO TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO, UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL (PALAS Y TRACHOS) DENDE SE TIENE LA A TODO COLGADO DE POLIETILENO DE ACTA DENSIIDAD DE 36" DE DIAMETRO, EN EL PROCESO DE LA EXCAVACION SE ENCONTRO CON SUPERFICIE PIEDRAS O ROCAS DE MAYOR DIMENSION, POR LO QUE SE TUVO QUE RECURRE A UN RETORNETEO PARA SU REMOCION, UTILIZANDO UNA PUNTA TIENE- RADORA DE ENERGIA ELECTRICA PARA PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION.



C. LOPEZ SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Cdo. Tehuantepec, Oax.

C. VALENTIN SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ENRIQUE HERNANDEZ
REGION DE OBRAS PUBLICAS



REGIDURIA DE
OBRAS
Santa María
Guienagati
Cdo. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

18 / sept. / 2023

FOLIO

004

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: PALENQUE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-009/2023

FONDO:

FAISMUN

PROGRAMA:

URBANIZACION

SUBPROGRAMA:

CAMINO SACACOSECHAS

Nota 04.

Fecha: 18 de septiembre de 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA DE DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE CONTINUAN Y TERMINAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION ANILLO, UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL (PALA Y TRACTO) DONDE SE TENORA EL TORO CARBUJADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 36" DE DIAMETRO, EN EL PROYECTO DE EXCAVACION SE ENCONTRO CON NATURAL, PIEDRAS O ROCAS DE MAYOR DIMENSION, QUE OBSTRUYE LA LINEA O DONDE IRA UN TUBERIA, POR LO QUE SE TENDR QUE RECURRER A UN POTOMETRICO PARA SU DEMOLICION, UTILIZANDO UNA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA. PARA PODER CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION.

ASI MISMO, SE REALIZA LA PREPARACION PARA EL COLADO DE PAVIMENTO DE 5 CM. CON CONCRETO SIMPLE $f'c = 100 \text{ kg/cm}^2$, SE REALIZA EL COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABANDO CON CARPETA Y TAMBOS. DONDE SE DESPLANTARA EL MURO CADEZOTE CON CONCRETO CICLOPEO.


CARLOS SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO




PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Santa María
Guienagati,
Oax. Huantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. VALDINO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ENRIQUE HERNANDEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Santa María
Guienagati,
Oax. Huantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIONAL DE
OBRAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

22 / SEPT. / 2023

FOLIO

005

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

LOCALIDAD: PALENQUE

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

ESTADO: OAXACA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-009/2023

FONDO: FAISMUN

PROGRAMA: URBANIZACION

SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS


NOTA 05.

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE REALIZA LA INSTALACION Y COLOCACION DE TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 36" ϕ . SOBRE EL FONDO DE LA CERRA, VERIFICANDO LOS NIVELES.

ASI MISMO, SE REALIZA EL ENLORADO DE OBRA O CUMBRA DE CONTACTO, PARA LA CONSTRUCCION DE MURE CABEZOTE, UTILIZANDO TABLAS DE MADERA Y PUNES, DE UNA FORMA TEMPORAL CON UNA ALTURA DE 1.75 MTS.

ASI, SE PROCEDE A LA PREPARACION Y COLOC. DE MURE CABEZOTE DE FORMA TEMPORAL CON UNA ALTURA DE 1.75 MTS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REFORZADOR, VALORES EN LA PASTILLA Y TAMBO DE 19.0 US. CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRAS NO MAYOR A 70 CM. DE UN LADO DEL CANAL.

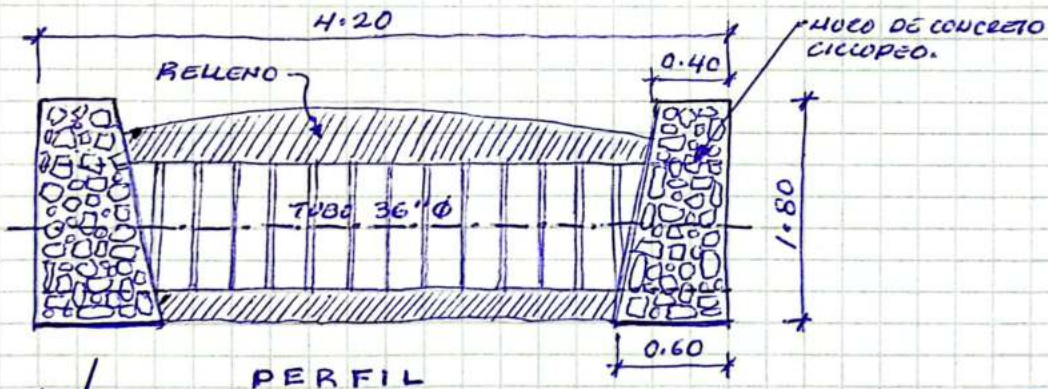

C. LEONEL SANCHEZ CUEZ
RESPONSABLE TECNICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Oaxaca, Oaxaca
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL.
01/09/2023 - 31/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
PERIODE DE OBRAS PUBLICAS

REGISTRARIA DE OBRAS
Santa María Guienagati,
Oaxaca, Oaxaca
01/09/2023 - 31/12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

26 / sept. / 2023

FOLIO

006

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.

MSMG/412/F-III-009/2023

LOCALIDAD: PALENQUE

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA:

URBANIZACION

ESTADO: OAXACA

SUBPROGRAMA:

CAMINO SACACOSECHAS

NOTA OG.

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

EN VISITA DE OBRA REALIZADA EL DIA DE HOY, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN LA CONSTRUCCION DE CIMBRA DE OBRA PUESA O CIMBRA POR CONTACTO PARA EL MURO CASOZOTE, UTILIZANDO TABLAS DE MADERA Y PUNTES, DE UNA FORMA TEMPORAL CON UNA ALTURA DE 1.75 MTS.


ASI MISMO, SE PROCESO A LA PREPARACION Y COLADO DE MURO CASOZOTE CON CONCRETO CILINDRO DE FORMA TEMPORAL CON UNA ALTURA DE 1.75 MTS. CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VACIADO CON CARNETILLA Y TAMBOR DE 19 LTS. UTILIZANDO PIEDRAS NO MAYOR A 20 CMS. DEL OTRO LADO DEL ENLACE.

DE IGUAL FORMA, INICIAN CON EL RELLENO DE CERRA, CON MATERIAL PRODUCCION DE LA MISMA EXCAVACION, APISONADO CON PIZON DE MOTO, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS.


C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. de Oaxaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025
C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL.


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Santa María Guienagati,
Dpto. de Oaxaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati,
Dpto. de Oaxaca, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI OAX.

2025

FECHA

03 / OCT. / 2023

FOLIO

007

OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO ARROYO PAZLE - PALENQUE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT. MSMG/412/F-III-009/2023

LOCALIDAD: PALENQUE

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: SANTA MARIA GUIENAGATI

PROGRAMA: URBANIZACION

ESTADO: OAXACA


SUBPROGRAMA: CAMINO SACACOSECHAS

NOTA 07.

Fecha: 03 DE OCTUBRE DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES REALIZAN EL DESCIMBRADO DE CABEZOTE DE CONCRETO CICLOPEO, RETIRANDO TABLAS, PORMEX Y CLAVOS, DEJANDO TODO EL LUGAR LIMPIO PARA SU POSTERIOR RELLENO DE CEPA.


ASI MISMO, CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE RELLENO EN CEPAS, CON HERRAMIENTAS MANUALES, UTILIZANDO PALAS Y CARRETILLAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION APISONADO CON PICO DE MANO, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS. A LOS COSTADOS DE LA TUBERIA DE FUNDICION DE ALTA DENSIDAD DE 36" Ø.


E. LEONEL SANCHEZ CRUZ
RESPONSABLE TECNICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Cm. Tequiapetec, Oax.


01/01/2023 - 31/12/2025


C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGISTRÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati,


C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGISTRAR DE OBRAS PUBLICAS

01/01/2023 - 31/12/2025
