

FECHA

18 / Mayo / 2023

FOLIO

001

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023

FECHA: 08-may-23

LOCALIDAD: Arroyo Pasle

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: Santa Maria Guienagati

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

ESTADO: Oaxaca

SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 1.

FECHA: 18 DE MAYO DE 2023.

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023, SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA DE OBRA PARA REGISTRO DE SUS NOTAS RELEVANTES RELACIONADAS CON LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE". SE DIERON CITA EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS CC. VICERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAX. ASI MISMO EL C. ISAIMS ZAMORA ALFARO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL. CON LA FINANCION DE ESTABLECER LOS NUEVOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA APEGADO A LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

EN SU PARTICIPACION, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ANUNCIA LA INVERSION PROGRAMADA PARA ESTA OBRA SIENDO ESTA LA CANTIDAD DE \$1,209,331.77 CON LA META DE CONCLUIR EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO

A SU VEZ, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INVITA A LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA Y A LA COMUNIDAD ENTERA DE ARROYO PASLE, A ORGANIZARSE PARA QUE ADENAS DEL BENEFICIO DIRECTO DE LA OBRA, PUEDAN SER QUIENES REALICEN LOS TRABAJOS DESDE LOS PRELIMINARES HASTA SU CONCLUSION.

UNA VEZ DADA SU INTERVENCIÓN, EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMITIVA, HACEN EL RECONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CON LA AYUDA DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA OBRA. POSTERIORMENTE DA EL BANDERAZO DE ARRANQUE DE DICHA OBRA SIENDO LAS 10:15 HRS. DE ESTA MISMA FECHA, ESTANDO PRESENTE EN EL SITIO YA EL PERSONAL ASIGNADO, ASI COMO LA MAQUINARIA NECESARIA.

AL CUERRE DE LA PRESENTE NOTA, QUEDA ASENTADA QUE LAS PERSONAS INDICADAS PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE LAS MUTACIONES EN LA PRESENTE BITACORA SON LOS CC. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Y LEONEL SANCHEZ CRUZ, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE. ACLARANDO QUE LAS NOTAS DEBERAN SER UNICAS Y EXCLUSIVAMENTE RELATIVAS A LA OBRA QUE SE EJECUTARA.

QUEDA ESTABLECIDO DE IGUAL FORMA QUE LA BITACORA DEBERA REPETIRSE OMIEN- NENTE EN LAS OPORTUNIDADES DE LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María Guienagati

C. VICERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE 01/01/2023 - 31/12/2025

C. LEONEL SANCHEZ CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA



REGIDURIA DE OBRAS

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS P.
Mto. T. Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. ISAIMS ZAMORA ALFARO
PRESIDENTE COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI

2025

FECHA

19 / MAYO / 2023

FOLIO

002

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023

FECHA: 08-may-23

LOCALIDAD: Arroyo Pasle

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: Santa María Guienagati

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

ESTADO: Oaxaca

SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 2.

FECHA: 19 DE MAYO DE 2023.


SE REGISTRA LA PRESENTE NOTA PARA INFORMAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y A LA SUPERVISION DE OBRA, QUE SE DAN INICIO A LOS TRABAJOS REFERENTE AL MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO, INICIANDO CON LAS ACTIVIDADES:

LIMPIEZA Y DESMUNTE DE CAMINO CON MEDIOS MANUALES, QUITANDO RAMAS, LIMPIANDO Y DESMUNTE LAS BUNTARIAS. TODO EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMUNTE ES LLEVADO A UN PUNTO ESTRATEGICO, INDICADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y POSTERIORMENTE SER QUEMADO.

ASI MISMO SE REALIZA EL BORTE Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUCRASANTE, ABATIMIENTO DE TALUDS, REBAJOS DE CORONA, DE COSTES Y TERRAPIENES EXISTENTES CON MAQUINARIA PESADA TRACTOR D-8N CATPILLAR.

FUERZA DE TRABAJO:

- 5 OBREROS.
- 1 OPERADOR
- 1 MAQUINA TRACTOR D-8N CAT.

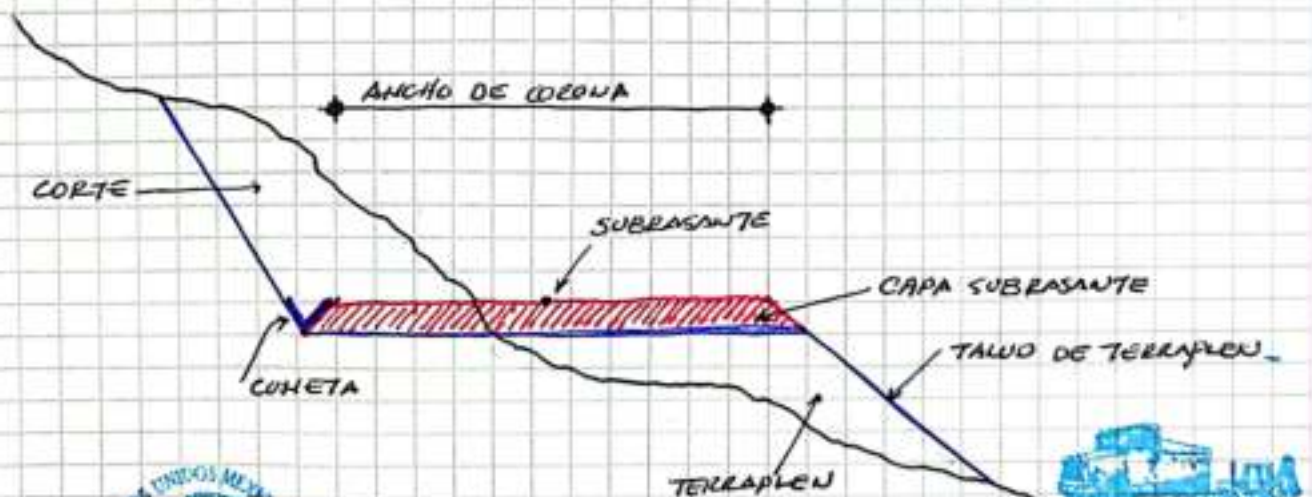

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. VALERIA ANTONIO
PRESIDENSA MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati,
Tehuantepec, Oax.

C. ENRIQUE HELMOR PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
19/05/2023 5:11/2023

Supervisor de Obra

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI

2025

FECHA

22/MAYO/2023

FOLIO

003

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023

FECHA: 08-may-23

LOCALIDAD: Arroyo Pasle

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: Santa Maria Guilenagati

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

ESTADO: Oaxaca

SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 3.

FECHA: 22 DE MAYO DE 2023.

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA EN ESTE DIA, SE OBSERVA A LOS TRABAJADORES Y MAQUINARIA, REALIZANDO TRABAJOS DE:

LIMPIEZA Y DESMOLTE DE CAMINO CON MEDIOS MANUALES, QUITANDO RAMAS, LIMPIANDO Y DESASOLVANDO LAS ALCANTARILLAS. TODO EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMOLTE ES LLEVADO AL LUGAR INDICADO, PARA POSTERIORMENTE SER QUEMADO.

ASI MISMO LA MAQUINA TRACTOR D-8N ENTERRILLAR, CONTINUA CORTANDO Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES DE CORONA, DE CORTES Y TERRAPLENES EXISTENTES.

FUERZA DE TRABAJO:

- 5 CHALANES
- 1 OPERADOR
- 1 MAQUINA TRACTOR D-8N ENTERRILLAR



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Santa Maria Guilenagati, Oax.
01 91 2072 - 21/12/2025



REGIDURIA DE OBRAS

Santa Maria Guilenagati, Oax.
01 91 2072 - 21/12/2025

C. ENRIQUE HERNANDEZ FELIX
REGIDOR DE OBRAS

C. LUIS SUAREZ CRUZ

FECHA

25 / mayo / 2023

FOLIO

004

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023

FECHA: 08-may-23

LOCALIDAD: Arroyo Pasle

FONDO:

FAISMUN

MUNICIPIO: Santa María Guienagati

PROGRAMA:

URBANIZACIÓN

ESTADO: Oaxaca

SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 4.

FECHA: 25 DE MAYO DE 2023.

CON ESTA FECHA, CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESMONTES DE RAMAS CON MEDIOS MANUALES, QUITANDO RAMAS Y TODO LO QUE OBSTRUYE EL CAMINO, LIMPIANDO Y DESASOLANDO LAS ALICANTARILLAS. RECOGIENDO TODO EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMONTES Y SE LLEVADO AL LUGAR INDICADO.

EL TRACTOR D-8N CATERPILLAR, CONTINUA ELEVANDO Y ADICIONALES ABajo DE LA SOBRESANTE, ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES DE CROWNAS, DE CERCA Y TERRAPLENES EXISTENTES.

EN ESTE DIA EN LA OBRA, LA VISITA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL E VALERIO SALVADOR ANTONIO Y DEL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS EL R. CURIO HERNANDEZ PEREZ. RECORRIENDO, VERIFICANDO Y CONSTATANDO QUE LOS TRABAJOS SE LLEVAN A CABO EN TIEMPO Y FORMA.

FUERZA DE TRABAJO:

- 5 CHALANES
- 1 OPERADOR
- 1 MAQUINA TRACTOR D-8N CATERPILLAR.



PRESIDENCIA

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.

C. CURIO HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS.

C. KENIA SANCHEZ CARR
SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI

2025

FECHA

29 / Mayo / 2023

FOLIO

005

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023

FECHA: 08-may-23

LOCALIDAD: Arroyo Pasle

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: Santa María Guienagati

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

ESTADO: Oaxaca

SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 5.

FECHA: 29 DE MAYO DE 2023

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA EN ESTE DIA, SE OBSERVA AL PERSONAL Y LA MAQUINARIA, REALIZANDO TRABAJOS DE:

CORTE Y ADICIONALES ABJO DE LA SUBRASANTE, ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES DE CROWNAS, CORTES Y TERREPLENOS EXISTENTES. CON UNA MAQUINA TRACTOR D-8N CATERPILLAR

FUERA DE TRABAJO:

- 1 AYUDANTE
- 1 OPERADOR
- 1 MAQUINA TRACTOR D-8N ENT.



PRESENCIA
MUNICIPAL

C VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURIA DE
OBRAS

Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.

01/01/2023 - 31/12/2025

C LEONEL FRANCISCO LAZAR
SUPERVISOR DE OBRAS

C ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
PROVIDOR DE OBRAS

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI

2025

FECHA

01 / JUNIO / 2023

FOLIO

006

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.: MSMGI/412/001/2023

FECHA: 08-may-23

LOCALIDAD: Arroyo Pasle

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: Santa María Guienagati

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

ESTADO: Oaxaca

SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 6.

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2023.

CON ESTA FECHA, CONTINUA EL TRACTOR D-BN CAT. CON EL CORTE Y ABICIONA-
LET ABJO DE LA SUBRASANTE, ABATIMIENTO DE TRUDES, REBAJES DE BORNAS, COR-
TES Y TERRAPIENTES EXISTENTES.

SIENDO LAS 11:15 AM DE LA FECHA ANTERIOR CITADA, SE INFORMA QUE LOS TRA-
BAJOS DE CORTE Y ABATIMIENTO DE CARONA FUERON SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE, YA
QUE EL TRACTOR D-BN SUFRIÓ UN DESPERFECTO EN SU SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, POR
LO QUE SE HA SOLICITADO EL APOYO DEL MECANICO PARA QUE SE ATIENDA A LA BREVE-
DAO POSIBLE EL DESPERFECTO.

SE LICIA LA PRESENTE NOTA INFORMANDO QUE EL DESPERFECTO DE LA MAQUINA
FUE ATENDIDO Y REPARADO, POR LO QUE LOS TRABAJOS SERAN REANUDADOS HASTA EL
DIA DE MAÑANA.



C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María

Oaxaca

C. ESTEBAN HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS 23 - 31/12/2025

C. LEONEL SANCHEZ CUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI

2025

FECHA

05 / JUNIO / 2023

FOLIO

007

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023

FECHA: 08-may-23

LOCALIDAD: Arroyo Pasle

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: Santa María Guienagati

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

ESTADO: Oaxaca

SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 7.

FECHA: 05 DE JUNIO DE 2023

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA EN ESTE DIA, SE OBSERVA AL PERSONAL Y LA MAQUINARIA, REALIZANDO TRABAJOS DE:

CORTE Y ADICIONALES AJOJO DE LA SUBRASANTE, ABTIMIENTO DE TALUDES, RE-ENJER DE ESCORLAS, CORTES Y TERRAPLENES EXISTENTES. CON MAQUINARIA PESADA TRACTOR D-BN CAT.

AS MISMO LA MOTOCONFORMADORA REALIZA LA LIMPIEZA, DESBOSQUE Y FORMACION DE CUNETAS, RETIRANDO TODO MATERIAL SOBRANTE FUERA DE CAMINO. DE IGUAL FORMA REALIZA EL RASTRO DE CAMINO PARA RETIRAR TODA CAPA VEGETAL Y ASI-RENVIELAR LA TERRACERIA.

HABIENDO REALIZADO UN RECORRIDO PREVIO, PARA LOCALIZAR Y UNICAR LAS CON-DICIONES PARA PODER EXTRAER Y CARGUEAR MATERIAL CEMENTANTE, EL LUGAR IN-DICADO Y ACORDADO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLA. TOMANDO TODOS LOS ACUERDOS CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y NO HAYA NINGUN TIPO PROBLEMAS.

FUERZA DE TRABAJO:

- 1 AYUDANTE
- 2 OPERADORES.
- 1 MOTOCONFORMADORA
- 1 TRACTOR D-BN CAT.

EN ESTE DIA TUVINOS EN LA OBRA LA VISITA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL VALE-PIO SALVADOR ANTONIO Y DEL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS EL C. ENRIQUE HERNAN-DEZ PEREZ. HACIENDO UN RECORRIDO EN TODO EL TRAMO, PARA VERIFICAR QUE EFEC-TIVAMENTE SE ESTAN LLEVANDO A CABO LOS TRABAJOS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Valero Salvador Antonio
Presidente Municipal
Santa María Guienagati
Oaxaca, Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Enrique Hernández Pérez
Regidor de Obras
Santa María Guienagati, Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. Leobardo Sánchez Cruz
Supervisor de Obra

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI

2025

FECHA

08 / JUNIO / 2023

FOLIO

008

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCIÓN: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023

FECHA: 08-may-23

LOCALIDAD: Arroyo Pasle

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: Santa María Guienagati

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

ESTADO: Oaxaca

SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 8.

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2023.

CON ESTA FECHA, SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO, CON LAS ACTIVACIONES DE:

CORTE Y ADICIONALES ADJO DE LA SUBRASANTE, ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJOS DE COLINAS, BORDES Y TERRAPLENES EXISTENTES, CON MAQUINARIA PESADA TRACTOR D-8N CAT.

ASI MISMO LA MOTO-CONFORMADORA CONTINUA REALIZANDO LA LIMPIEZA, DESARROJE Y FORMACIÓN DE CUNETAS, RETIRANDO TODO MATERIAL SOBLENDE FUERA DEL CAMINO. DE IGUAL FORMA REDUZA EL PASTEO DE CABALLO PARA RETIRAR TODA CAPA VEGETAL Y ASI PODER REEMPLAZAR LA TERRACERIA.

EL DIA DE HOY, LA RETROEXCAVADORA SE ENCUENTRA EN EL BANCO DE MATERIAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLA, REALIZANDO CARTE DE MATERIAL TIPO C Y FORMANDO BANCO DE PRESTAMO, PARA SU POSTERIOR ACARGO.

FUERA DE TRABAJO:

- 1 AYUDANTE.
- 3 OPERADORES.
- 1 MOTO-CONFORMADORA.
- 1 TRACTOR D-8N.
- 1 RETROEXCAVADORA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Valente Sánchez Antonio
Presidente Municipal
Santa María Guienagati
Oaxaca
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

C. Enrique Hernández Pérez
Regidor de Obras
Santa María Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. Leonel Sánchez Cruz
Supervisor de Obra

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI

2025

FECHA 12 / JUNIO / 2023

FOLIO 009

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023

FECHA: 08-may-23

LOCALIDAD: Arroyo Pasle

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: Santa Maria Guienagati

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

ESTADO: Oaxaca

SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 9.

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2023.

EN VISITA REVISADA A LA OBRA CUESTE DIA, SE OBSERVA AL PERSONAL Y A LA MAQUINARIA, REALIZANDO TRABAJOS DE:

CORTE Y ADICIONALES AJOJO DE LA SUBRASANTE, ABATIMIENTO DE TOLDES, RE-DISEÑO DE CERCANAS, CORTES Y TEMPLONES EXISTENTES, CON MAQUINARIA PESADA TRACTOR D-8N CAT.

ASI MISMO LA MOTOCONFORMADORA CONTINUA CON LA LIMPIEZA, DESARQUE Y FORMACION DE CUNETAS, RETIRANDO TODO MATERIAL SOBANTE FUERA DEL CAMINO. DE IGUAL FORMA REALIZA EL PASTREO DE CAMINO PARA RETIRAR TODA CAPA VEGETAL Y ASI BENEFICIAR LA TERRACERIA.

LA RETROEXCAVADORA CONTINUA EN GANCHO DE MATERIAL, REALIZANDO CORTE TIPO C Y FORMANDO BANCO DE PRESTAMO. ASI MISMO REDUZA LA CARGA DE MATERIAL Y ACARRAEO EN CAMION VOLTEO DE 7 M³. PARA EL ACARRIOLADO Y TENDIDO DE MATERIAL. PARA EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO.

FUERZA DE TRABAJO:

- 1 AYUDANTE.
- 3 OPERADORES.
- 1 MOTOCONFORMADORA.
- 1 TRACTOR D-8N CAT.
- 1 RETROEXCAVADORA.
- 1 VOLTEO DE 7 M³.



C. VALERIO SANCHEZ ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. LEONEL VALENZUELA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA



C. ENRIQUE HELMIGER PEREZ
REGIDOR DE OBRAS P.
Santa María Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI

2025

FECHA

16 / JUNIO / 2023

FOLIO

010

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023

FECHA: 08-may-23

LOCALIDAD: Arroyo Pasle

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: Santa María Guienagati

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

ESTADO: Oaxaca

SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 10.

FECHA: 16 DE JUNIO DE 2023

CON ESTA FECHA, EL TRACTOR D-BN CAT. CONTINUA CON EL REBATE Y ADIVENAMES ABAJO DE LA SUBRASANTE, ABATIMIENTO DE TAUDES, REBAJES DE COPOLAS, CORTES Y TERRAPIENES EXISTENTES.

ASI MISMO LA MOTOCONFORMADORA CONTINUA CON LA LIMPIEZA, DESAROLTE Y FORMACION DE CUJETAS, RETIRANDO TODO MATERIAL SOBRIANTE FUERA DEL CAMINO. DE IGUAL FORMA REALIZA EL PASTEO DE CAMINO PARA RETIRAR TODA ENPA VEGETAL Y ASI REVIVELAR LA TERRACERIA.

LA RETROEXCAVADORA CONTINUA EN EL BANCO DE MATERIAL, REALIZANDO COLTE DE MATERIAL TIPO C Y FORMANDO BANCO DE PRESTAMO. ASI MISMO CONTINUA CARGANDO Y MARRRANDO MATERIAL EBMENTANTE EN CARRON VOTCO DE 7 M³ PARA EL REARMEZCLADO Y EL TENDIDO DE MATERIAL PARA EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO.

FUERZA DE TRABAJO:

- 1 AYUDANTE.
- 3 OPERADORES.
- 1 MOTOCONFORMADORA.
- 1 TRACTOR D-BN CAT.
- 1 RETROEXCAVADORA.
- 1 VOLTEO 7 M³

EN ESTE DIA TUVIAMOS LA VISITA A LA OBRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, C. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ. RECORRIENDO EL CAMINO Y VERIFICANDO QUE SE ESTEN REALIZANDO LOS TRABAJOS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Santa María Guienagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS P.
01/01/2023 - 31/12/2025

C. LEONARDO FUENTES LIZ
SUPERVISOR DE OBRA

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI

2025

FECHA

20 JUNIO 2023

FOLIO

011

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCIÓN: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023

FECHA: 08-may-23

LOCALIDAD: Arroyo Pasle

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: Santa María Guienagati

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

ESTADO: Oaxaca

SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 11.

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2023

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA EN ESTE DIA, SE OBSERVA AL PERSONAL Y LAS MAQUINAS REALIZANDO TRABAJOS DE:


LIMPIEZA, DESASOLME Y FORMACION DE CUNETAS, RETIRANDO TODO MATERIAL SOBRAANTE FUERA DEL CAMINO. DE IGUAL FORMA CONTINUA CON EL PASTEO DE CAMINO PARA RETIRAR TODA ESA VEGETAL Y ASI REVICULAR LA TERRACERIA.

LA RETROEXCAVADORA CONTINUA CARGANDO Y ACARREANDO MATERIAL REMOVIENDO EN CARRON VOTRO DE 7 m³ Y LLEVADO AL LUGAR DE LA OBRA, PARA SU POSTERIOR TENDIDO.

LA MOTOCOLFILLADORA INICIA CON EL BARRILLONADO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO (CANTONANTE) PARA EL REVOSTIAMIENTO DEL CAMINO. RETIRANDO FRAGMENTO DE KOCA MAYORES.

FUERZA DE TRABAJO:

- 1 AYUDANTE
- 3 OPERADORES
- 1 MOTOCOLFILLADORA
- 1 RETROEXCAVADORA
- 1 VOTRO 7 m³.

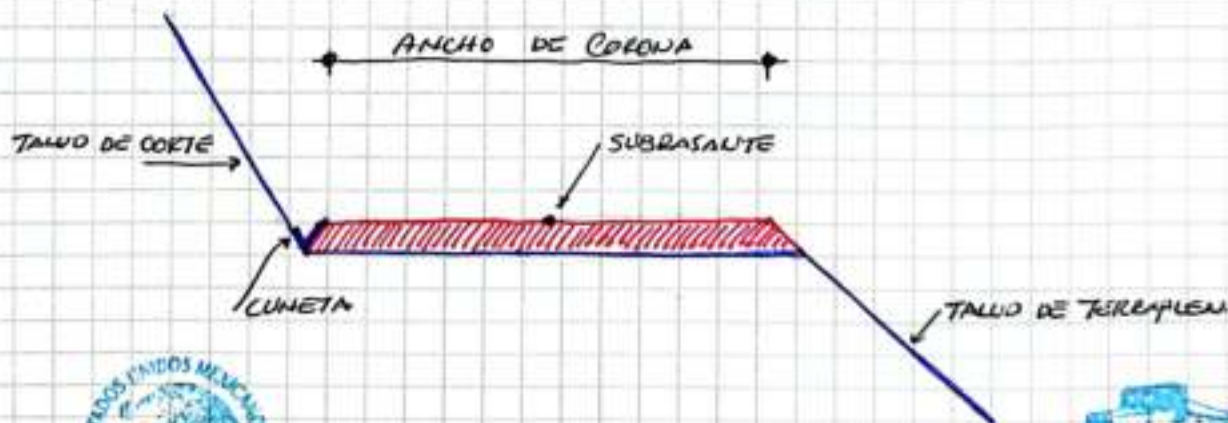

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. VALERIA SALAZAR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
POSIDOR DE OBRAS.
2023 - 31/12/2025

C. LEONARDO HERNANDEZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA

FECHA

24 / JUNIO / 2023

FOLIO

012

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA

OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023 FECHA: 08-may-23

LOCALIDAD: Arroyo Pasle

FONDO: FAISMUN

MUNICIPIO: Santa María Guienagati

PROGRAMA: URBANIZACIÓN

ESTADO: Oaxaca

SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

Nota 12.

Fecha: 24 DE JUNIO DE 2023.

CON ESTA FECHA, CONTINUAN CON LA LIMPIERA, DESARROLLO Y FORMACIÓN DE CUNETAS, RETIRANDO TODO MATERIAL SOBRAANTE FUERA DEL CAMINO. DE NUAL FORMA LA MOTOCOMPACTADORA CONTINUA CON EL RASTREO DE CAMINO PARA RETIRAR TODA CAPA VEGETAL Y ASI REINICIAR LA TERRACERIA.

LA RETROEXCAVADORA CONTINUA CARGANDO Y ACARRIANDO MATERIAL CEMENTANTE EN CAMION VOLICO DE 7 M³. Y LLEVADO AL LUGAR DE TIRO, PARA SU POSTERIOR TENDIDO.

LA MOTOCOMPACTADORA CONTINUA CON EL RANDELLONADO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE PARA EL PAVIMENTADO DEL CAMINO Y RETIRANDO FRAGMENTOS DE PIEDRAS MAYORES.

FORZA DE TRABAJO:

- 1 Ayudante
- 3 OPERADORES
- 1 MOTOCOMPACTADORA
- 1 RETROEXCAVADORA
- 1 VOLICO 7 M³.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. VICTOR ANTONIO SALAS
Presidente Municipal
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE OBRAS

Santa María Guienagati, Tehuantepec, Oax.

C. ERIC HERNANDEZ
Regidor de Obras

C. LEONARDO SUAREZ
Supervisor de Obra

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS

FECHA 27 / JUNIO / 2023

FOLIO 013

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.
MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023 FECHA: 08-may-23
LOCALIDAD: Arroyo Pasle FONDO: FAISMUN
MUNICIPIO: Santa María Guienagati PROGRAMA: URBANIZACIÓN
ESTADO: Oaxaca SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 13.

FECHA: 27 DE JUNIO DE 2023

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA EN ESTE DIA, SE OBSERVA AL PERSONAL Y LA MAQUINARIA, REALIZANDO TRABAJOS DE:

CARGA DE MATERIAL DE BANCO (CONCRETANTE) CON RETROEXCAVADORA Y ACARRIO DEL MISMO EN CAMION VOLTEO DE 7 M³ Y LLEVADO AL LUGAR DE TIRO, PARA SU POSTERIOR TENDIDO.

LA MOTOCONFORMADORA CONTINUA CON EL ACABALLADO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO (CONCRETANTE) PARA EL REVESTIMIENTO DEL ENLACE, ASI MISMO RETIRANDO FRAGMENTOS DE PIEDRAS MAYORES A 3".

FUERA DE TRABAJO:

- 1 Ayudante.
- 3 Operadores
- 1 Motoconformadora
- 1 Retroexcavadora.
- 1 Volteo de 7 m³.



PRESIDENCIA
MUNICIPIO AUTONOMO
Santa María Guienagati,
Tehuantepec, Oax.

C. Legido Smejter Cruz



REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María Guienagati

C. Enrique Hernández Pérez
Regidor de Obras 12/2025

BITACORA DE OBRA

2023

H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUIENAGATI

2025

FECHA 01 / JULIO / 2023

FOLIO 014

OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERRACERO TRAMO: ENTRONQUE LA BOTIJA - CIENEGUILLA A ARROYO PASLE.

MOD. DE EJECUCION: ADMON. DIRECTA
LOCALIDAD: Arroyo Pasle
MUNICIPIO: Santa Maria Guienagati
ESTADO: Oaxaca

OF. DE AUT.: MSMG/412/001/2023 FECHA: 08-may-23
FONDO: FAISMUN
PROGRAMA: URBANIZACIÓN
SUBPROGRAMA: CAMINOS RURALES

NOTA 14

FECHA: 01 DE JULIO DE 2023.

EN ESTA FECHA, SIENDO LAS 10:20 HRS. SE DAN LITA POR PRIMER AUSE, LA AUTORIDAD MUNICIPAL REPRESENTADO POR EL CC. VALERIO SALVADOR ANTONIO Y ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE Y DEMAS PERSONAS MIEMBROS DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL. CON EL OBJETO DE REVISAR Y VERIFICAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN BASE AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QUE CON CANTIDAD DE CONCEPTOS EN MANOS SE REVISAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y SE VAN PAGANDO CONCEPTO POR CONCEPTO.

DESPUES DE UNA MINUCIOSA REVISION, QUEDA CONFIRMANDO QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CONCLUIDOS Y QUE LA OBRA ESTA APTA PARA SU RECEPCION FINAL.

EN SEGUIDA EL PRESIDENTE MUNICIPAL HACE SU PARTICIPACION FELICITANDO A LA COMUNIDAD DE ARROYO PASLE POR ESTA OBRA NUEVA QUE VENDRA A CONTRIBUIR GRANDEMENTE EN LA POBLACION. POR LO QUE SOLICITO A LOS PRESENTES QUE VALOREN LOS ESFUERZOS Y LA INVERSION HECHA POR LOGRAR ESTA OBRA.

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA OFICIALMENTE CONCLUIDA LA OBRA, MANIFESTANDO QUE LA PRESENTE BITACORA QUEDA DE IGUAL FORMA OFICIALMENTE CERRADA CON ESTA ULTIMA NOTA. INTEGRADA DE UN TOTAL DE 14 NOTAS UTILES DECIDIVAMENTE REQUISITADAS Y AVANZADAS, MENCIONANDO QUE CUALQUIER NOTACION POSTERIOR A LA PRESENTE QUEDA AUTOMATICAMENTE ANULADA Y QUE DICHA BITACORA DEBE REPORTARSE A LA REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS PARA SU INTEGRACION AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL MISMO DIA DE SU APORTURA, SE CIERRA LA PRESENTE LITA FIRMANDOLA AQUELLOS QUE EN ESTE CIERRE DE OBRA PARTICIPARON.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María

C. VALERIO SALVADOR ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

01/01/2023 - 31/12/2025

C. LIONEL SANCHEZ CARRASCA
SUPERVISOR DE OBRA



REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

C. ISABEL ALVARO ALFARO
PRESIDENTE COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL

NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS
