

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.	Monto Contratado: \$ 490,000.00 Monto del Anticipo: \$ 147,000.00 Monto del Convenio: Total Contratado: \$ 490,000.00 Estimación Numero: 01 (UNO)	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES R.F.C.: LOOJ700716KG1 Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA, C.P. 70110 Teléfono: 971 137 41 76 Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023 Núm. De Hoja: 1 DE 19
Localidad: PASO LIMON Municipio: SANTA MARIA GUIENAGATI Estado: OAXACA	Recurso: RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023 Numero de Convenio de Diferimiento: Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023 De Fecha: De Fecha:	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023 Periodo de Conv. De Diferimiento: Periodo de Convenio Modificatorio:
---	---	---

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.		
A01	POSTES DE CONCRETO	UNIDAD
CLAVE	CONCEPTO	
A01-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PC-12-750 INCLUYE: HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.



AUTORIZO:
G. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
EMPRESA:
C. JAIME LOPEZ ORDOÑES
PERSONA FISICA
SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

ELABORÓ:
ING. BASILIO CHARIS SÁNCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769
TESORERÍA MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REGISTRO:
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
RESIDENCIA DE OBRAS
Santa Maria
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		Monto Contratado: \$ 490,000.00	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
		Monto del Anticipo: \$ 147,000.00	R.F.C.: LOOJ700716KG1
		Monto del Convenio:	CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC,
		Total Contratado: \$ 490,000.00	OAXACA. C.P. 70110
		Estimación Numero: 01 (UNO)	Teléfono: 971 137 41 76
		Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	Tel. Fax:
			Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
			Núm. De Hoja: 2 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		
A01	POSTES DE CONCRETO	UNIDAD
CLAVE	CONCEPTO	
A01-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PC-13-600 INCLUYE: HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.



AUTORIZO:
C. VALENTIN SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria
Guianagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
1/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
Santa Maria
Guianagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

Vo.Bo.
C. ALDA NELI GARCIA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
Santa Maria
Guianagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REVISO:
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
REGIDORIA DE OBRAS
Santa Maria
Guianagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


JAIME LOPEZ ORDOÑES
PERSONA FÍSICA
RFC: LOOJ700716KG1
C. TEHUANTEPEC # 112 BARRIO SAN ANTONIO
CD. IXTEPEC, OAX. C. P. 70110
TEL. 971 137 41 76
jaimelopez@hotmail.com

ELABORÓ:
ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.		Monto Contratado: \$ 490,000.00	Contratista: C. JAI ME LÓPEZ ORDOÑES
		Monto del Anticipo: \$ 147,000.00	R.F.C.: LOOJ700716KG1
		Monto del Convenio:	Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC,
		Total Contratado: \$ 490,000.00	OAXACA, C.P. 70110
		Estimación Numero: 01 (UNO)	Teléfono: 971 137 41 76
		Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	Tel. Fax:
			Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
			Núm. De Hoja: 3 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificadorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificadorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.		
A01	POSTES DE CONCRETO	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
A01-3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PC-09-450 INCLUYE: HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.

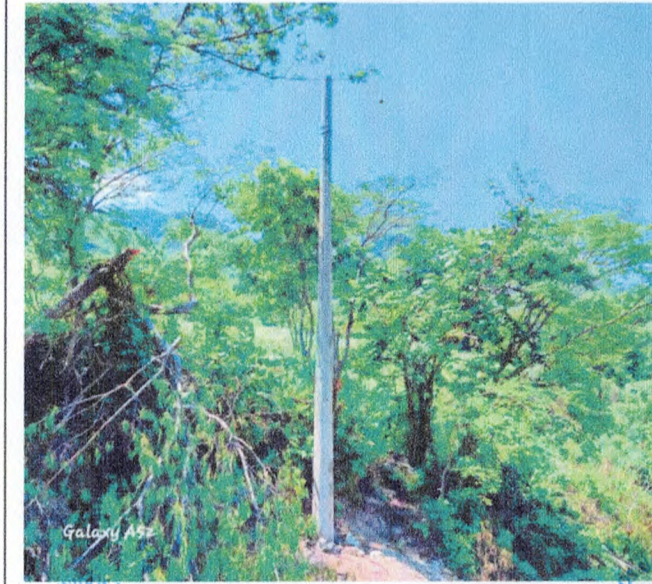

AUTORIZO:
C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:
C. ALDA NELI GONZALEZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REVISO:
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María
Guienagati,
Dto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

JAI ME LOPEZ ORDOÑES
EMPRESA
PERSONA FÍSICA
RFC: LOOJ700716KG1
C. TEHUANTEPEC # 112 BARRIO SAN ANTONIO
CD. IXTEPEC, OAX. C.P. 70110
TEL. 971 137 41 76 | cgolfo_jaime@hotmail.com

ELABORÓ:
ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

ING. JAIME LÓPEZ ORDOÑES (PERSONA FÍSICA)

REPORTE FOTOGRAFICO

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.

Localidad: PASO LIMON

Municipio: SANTA MARIA GUIENAGATI

Estado: OAXACA

Recurso:

RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Monto Contratado: \$ 490,000.00

Monto del Anticipo: \$ 147,000.00

Monto del Convenio:

Total Contratado: \$ 490,000.00

Estimación Numero: 01 (UNO)

Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023

Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES

R.F.C.: LOOJ700716KG1

Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC,
OAXACA. C.P. 70110

Teléfono: 971 137 41 76

Tel. Fax:

Fecha de Elaboración:
08 DE AGOSTO DE 2023

Núm. De Hoja:
4 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023

Numero de Convenio de Diferimiento:

Numero de Convenio Modificadorio:

De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023

De Fecha:

De Fecha:

Periodo de Contrato:

24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023

Periodo de Conv. De Diferimiento:

Periodo de Convenio Modificadorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.

ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION

CONCEPTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO VR2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

UNIDAD

Pza.

AUTORIZO:

C. VALERIO CALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.

Vo.Bo.

C. ALDA NEU QUIROZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

ELABORÓ:

ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

REVISO:

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

REGIDURÍA DE
OBRAS
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

EMPRESA:
JAIME LÓPEZ ORDOÑES
PERSONA FÍSICA
REC-1007700716KG1
C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
C. TEHUANTEPEC 112 BARRIO SAN ANTONIO
PERSONA FÍSICA
CD. IXTEPEC, OAX. C. P. 70110
TEL. 971 137 41 76 | correo: jaime@hotmail.com

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		Monto Contratado: \$ 490,000.00	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
		Monto del Anticipo: \$ 147,000.00	R.F.C.: LOO1700716KG1
		Monto del Convenio:	Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110
		Total Contratado: \$ 490,000.00	Teléfono: 971 137 41 76 Tel. Fax:
		Estimación Numero: 01 (UNO).	Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
		Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	Núm. De Hoja: 5 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		
A02	ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
A02-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO VD2N INCLUYE AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.



AUTORIZO:
C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Santa María
Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
Santa María
Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

Vo.Bo.
C. ALDA NELI QUIROZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
Santa María
Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


REVISO:
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
REGIDURÍA DE
OBRAS
Santa María
Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

JAIME LÓPEZ ORDOÑES
PERSONA FÍSICA
RFC: LOO1700716KG1
C. TEHUANTEPEC, COL. SAN ANTONIO
CD. IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110
TEL. 971 137 41 76 | cgolfo_jaime@hotmail.com

ELABORÓ:
ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.	Monto Contratado: \$ 490,000.00 Monto del Anticipo: \$ 147,000.00 Monto del Convenio: Total Contratado: \$ 490,000.00 Estimación Numero: 01 (UNO)	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES R.F.C.: LOOJ700716KG1 Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110 Teléfono: 971 137 41 76 Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023 Tel. Fax: Núm. De Hoja: 6 DE 19
Localidad: PASO LIMON Municipio: SANTA MARIA GUIENAGATI Estado: OAXACA	Recurso: RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	
Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023 Numero de Convenio de Diferimiento: Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023 De Fecha: De Fecha:	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023 Periodo de Conv. De Diferimiento: Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.		
A02	ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION	UNIDAD
CLAVE	CONCEPTO	
A02-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO AD2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.

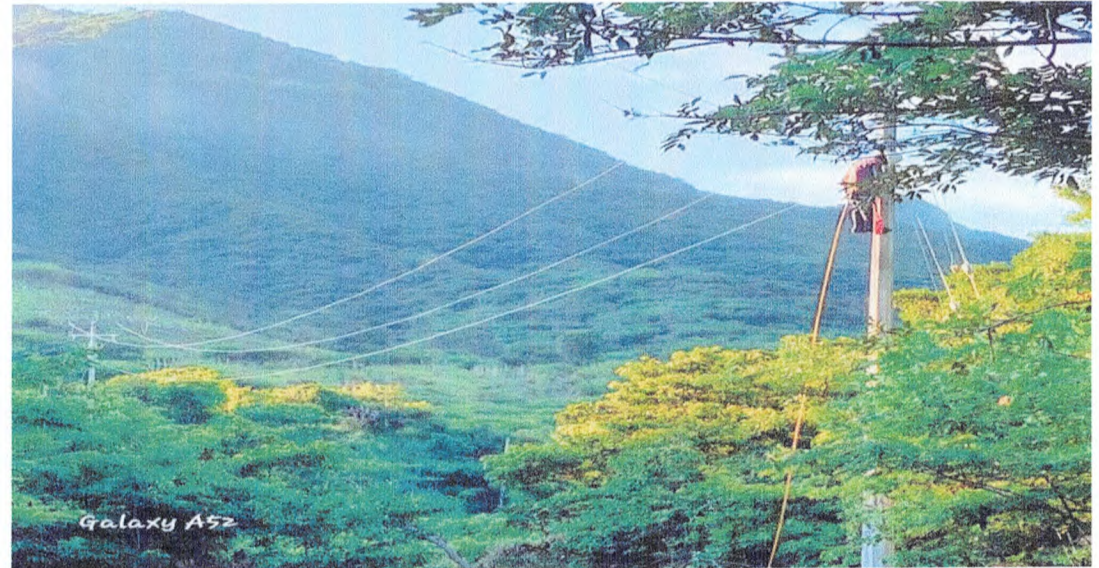

 C. VALERIO SALVADOR ANTONIL PRESIDENTE MUNICIPAL Santa Maria Guienagati, Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	 C. DAVID PEREZ ESCOBAR SINDICO MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL Santa Maria Guienagati, Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	 C. ALDA NELI QUIROZ PEREZ TESORERA MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL Santa Maria Guienagati, Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	 C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ REGIDOR DE OBRAS REGIDURÍA DE OBRAS Santa Maria Guienagati, Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025
 ELABORÓ: ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA CEDULA-7301769			

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICIDAD EN PASO LIMON.		Monto Contratado: \$ 490,000.00	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
		Monto del Anticipo: \$ 147,000.00	R.F.C.: LOOJ700716KG1
		Monto del Convenio:	Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110
		Total Contratado: \$ 490,000.00	Teléfono: 971 137 41 76 Tel. Fax:
		Estimación Número: 01 (UNO)	Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023		Núm. De Hoja: 7 DE 19	

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 - JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICIDAD EN PASO LIMON.		
A02	ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
A02-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO RD2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.



AUTORIZO:
C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO:
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZO:
C. ALDA NELQUIROZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZO:
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

MUNICIPAL
Santa María
Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

JAIME LÓPEZ ORDOÑES
PERSONA FÍSICA
RFC: LOOJ700716KG1
C. TEHUANTEPEC, SAN ANTONIO
CL. IXTEPEC, C.P. 70110
TEL. 971 137 41 76 | correo: jaime@hotmail.com

ELABORÓ:
ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

TESORERÍA
MUNICIPAL
Santa María
Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE
OBRAS
Santa María
Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

CONSTRUCCIONES DEL GOLFO

NUEVA GENERACIÓN
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LÍNEAS Y
REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA, SUBSTANCIAS AÉREAS
Y ALUMBRADO PÚBLICO OBRA CIVIL.

ING. JAIME LÓPEZ ORDOÑES (PERSONA FÍSICA)

REPORTE
FOTOGRAFICO

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.	Monto Contratado: \$ 490,000.00 Monto del Anticipo: \$ 147,000.00 Monto del Convenio: Total Contratado: \$ 490,000.00 Estimación Numero: 01 (UNO)	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES R.F.C.: LOOJ700716KG1 Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110 Teléfono: 971 137 41 76 Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
Localidad: PASO LIMON Municipio: SANTA MARIA GUIENAGATI Estado: OAXACA	Recurso: RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	Tel. Fax: Núm. De Hoja: 8 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificadorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificadorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.	
DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION	
CONCEPTO	UNIDAD
A03-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R1 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.



AUTORIZO:

C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO:

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

Vo.Bo.

C. ALDA NELQUIRA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

REVISO:

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

ELABORÓ:

ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769TESORERÍA
MUNICIPAL
Santa Maria
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025REGIDURÍA DE
OBRAS
Santa Maria
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		Monto Contratado: \$ 490,000.00	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
		Monto del Anticipo: \$ 147,000.00	R.F.C.: LOOJ700716KG1
		Monto del Convenio:	Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110
		Total Contratado: \$ 490,000.00	Teléfono: 971 137 41 76
		Estimación Numero: 01 (UNO)	Tel. Fax:
		Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
			Núm. De Hoja: 9 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		
A03	DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
A03-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R1/1R1 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.



AUTORIZO:
C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Santa María Guianagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZO:
C. ALDA NELI GUERRA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

REVISO:
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
REGIDURÍA DE OBRAS
Santa María Guianagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

JAIME LÓPEZ ORDOÑES
EMPRESA
PERSONA FÍSICA
R.F.C.: LOOJ700716KG1
C. TEHUANTEPEC 112 BARRIO SAN ANTONIO
CD. IXTEPEC OAX. C. P. 70110
TEL. 971 137 41 76 | cgolfo_jaime@hotmail.com

ELABORÓ:
ING. BASILIO CHARIS SÁNCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

TESORERÍA MUNICIPAL
Santa María Guianagati, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		Monto Contratado: \$ 490,000.00	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
		Monto del Anticipo: \$ 147,000.00	R.F.C.: LOO1700716KG1
		Monto del Convenio:	Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110
		Total Contratado: \$ 490,000.00	Teléfono: 971 137 41 76
		Estimación Numero: 01 (UNO)	Tel. Fax:
		Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
			Núm. De Hoja: 11 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		
A03	DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
A03-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R1/1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Santa María
Güienagati,
Oax.
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:

C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO:

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZO:

C. ALDA NELI QUIROGA PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

REVISO:

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

EMPRESA:
JAIME LOPEZ ORDOÑES
PERSONA FÍSICA
RFC: LOO1700716KG1
C. TEHUANTEPEC # 112 BARRIO SAN ANTONIO
CD. IXTEPEC, OAX. C. P. 70110
TEL 971 137 41 76 | cgolfo_jaime@hotmail.com

ELABORÓ:

ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

TESORERÍA
MUNICIPAL
Santa María
Güienagati,
Oax.
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE
OBRAS
Santa María
Güienagati,
Oax.
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.	Monto Contratado: \$ 490,000.00 Monto del Anticipo: \$ 147,000.00 Monto del Convenio: Total Contratado: \$ 490,000.00 Estimación Numero: 01 (UNO)	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES R.F.C.: LOOJ700716KG1 Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110 Teléfono: 971 137 41 76 Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
Recurso: Localidad: PASO LIMON Municipio: SANTA MARIA GUIENAGATI Estado: OAXACA	RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	Tel. Fax: Núm. De Hoja: 12 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023 Numero de Convenio de Diferimiento: Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023 De Fecha: De Fecha:	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023 Periodo de Conv. De Diferimiento: Periodo de Convenio Modificatorio:
---	---	---

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		
A03	DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
A03-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.



AUTORIZO: C. VALERIO SALVADOR ANTONIL PRESIDENTE MUNICIPAL Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	AUTORIZO: C. DAVID PEREZ ESCOBAR SINDICO MUNICIPAL	Vo. Bo. C. ALDA NALLEY ROZ PEREZ TESORERA MUNICIPAL	REVISO: C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ REGIDOR DE OBRAS
EMPRESA: JAIME LOPEZ ORDOÑES PERSONA FÍSICA C. TEHUANTEPEC OAX. C.P. 70110 TEL. 971 137 41 76 jlopez@hotmail.com	ELABORÓ: ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA CEDULA-7301769	TESORERÍA MUNICIPAL Santa María Guienagati, Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	REGIDURÍA DE OBRAS Santa María Guienagati, Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICIDAD EN PASO LIMON.	Monto Contratado: \$ 490,000.00 Monto del Anticipo: \$ 147,000.00 Monto del Convenio: Total Contratado: \$ 490,000.00 Estimación Numero: 01 (UNO)	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES R.F.C.: LOOJ700716KG1 Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA, C.P. 70110 Teléfono: 971 137 41 76 Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023 Tel. Fax: Núm. De Hoja: 14 DE 19
Localidad: PASO LIMON Municipio: SANTA MARIA GUIENAGATI Estado: OAXACA	Recurso: RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICIDAD EN PASO LIMON.		
A04	RETENIDAS	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
A04-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO RSA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, COLOCACIÓN DE PERNO Y ANCLA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.



AUTORIZO: C. VALERIO SALVADOR ANTONIL PRESIDENTE MUNICIPAL Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	AUTORIZO: C. DAVID PEREZ ESCOBAR SINDICO MUNICIPAL	Vo.Bo. C. ALDA MELI QUIROZ PEREZ TESORERA MUNICIPAL	REVISO: C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ REGIDOR DE OBRAS
JAIME LOPEZ ORDOÑES EMPRESA R.F.C.: LOOJ700716KG1 C. TEHUANTEPEC 112 BARRIO SAN ANTONIO CD. IXTEPEC, OAXACA TEL. 971 137 41 76 Correo: jaimelopezordones@hotmail.com		ELABORÓ: ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA CEDULA-7301769	REGIDURÍA DE OBRAS Santa Maria Guienagati, Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		Monto Contratado: \$ 490,000.00	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
		Monto del Anticipo: \$ 147,000.00	R.F.C.: LOOJ700716KG1
		Monto del Convenio:	Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110
		Total Contratado: \$ 490,000.00	Teléfono: 971 137 41 76 Tel. Fax:
		Estimación Numero: 01 (UNO)	Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023			Núm. De Hoja: 10 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		
DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION		
A03	CONCEPTO	UNIDAD
CLAVE		
A03-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO 1R3/1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.



AUTORIZO:

PRESIDENCIA
C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Santa María
Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:

C. DAVID PÉREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

Vo.Bo.

C. ALDA NEL QUIROZ PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

REVISO:

C. ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ
REGIDOR DE OBRAS

ELABORÓ:

ING. BASILIO CHARIS SÁNCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
Santa María
Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE
OBRAS
Santa María
Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

CONSTRUCCIONES DEL GOLFO

NEVA GENERACION
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LINEAS Y
REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA, BAJA TENSION AEREA
Y ALUMBRADO PÚBLICO OBRA CIVIL.

ING. JAIME LÓPEZ ORDOÑES (PERSONA FÍSICA)**REPORTE
FOTOGRAFICO**

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		Monto Contratado: \$ 490,000.00	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
Recurso:		Monto del Anticipo: \$ 147,000.00	R.F.C.: LOOJ700716KG1
Localidad: PASO LIMON		Monto del Convenio:	Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110
Municipio: SANTA MARIA GUIENAGATI		Total Contratado: \$ 490,000.00	Teléfono: 971 137 41 76 Tel. Fax:
Estado: OAXACA		Estimación Numero: 01 (UNO)	Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023 Núm. De Hoja: 15 DE 19
Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023			
Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023		Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023	
Numero de Convenio de Diferimiento:		Periodo de Conv. De Diferimiento:	
Numero de Convenio Modificatorio:		Periodo de Convenio Modificatorio:	

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		
A04	RETENIDAS	UNIDAD
CLAVE	CONCEPTO	
A04-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO READ INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, COLOCACIÓN DE PERNO Y ANCLA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.





AUTORIZO: C. VALERIO SALVADOR ANTONIL PRESIDENTE MUNICIPAL Santa Maria Guienagati, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	AUTORIZO: C. DAVID PEREZ ESCOBAR SINDICO MUNICIPAL Santa Maria Guienagati, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	Vo. Bo. C. ALDA NEL CIPRIOZ PEREZ TESORERA MUNICIPAL Santa Maria Guienagati, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	REVISO: C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ REGIDOR DE OBRAS Santa Maria Guienagati, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025
ELABORÓ: ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA CEDULA-7301769			
JAIME LOPEZ ORDOÑES EMPRESA: PERSONA FÍSICA RFC: LOOJ700716KG1 C. TEHUANTEPEC C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES CD IXTEPEC, OAX. C.P. 70110 TEL. 971 137 41 76 Correo: jaime@hotmail.com			

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.	Monto Contratado: \$ 490,000.00 Monto del Anticipo: \$ 147,000.00 Monto del Convenio: \$ 490,000.00 Estimación Numero: 01 (UNO)	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES R.F.C.: LOOJ700716KG1 Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110 Teléfono: 971 137 41 76 Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
Localidad: PASO LIMON Municipio: SANTA MARIA GUIENAGATI Estado: OAXACA	Recurso: RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	Tel. Fax: Núm. De Hoja: 16 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		
A04	RETENIDAS	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
A04-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO RVEAD INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, COLOCACIÓN DE PERNO Y ANCLA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.

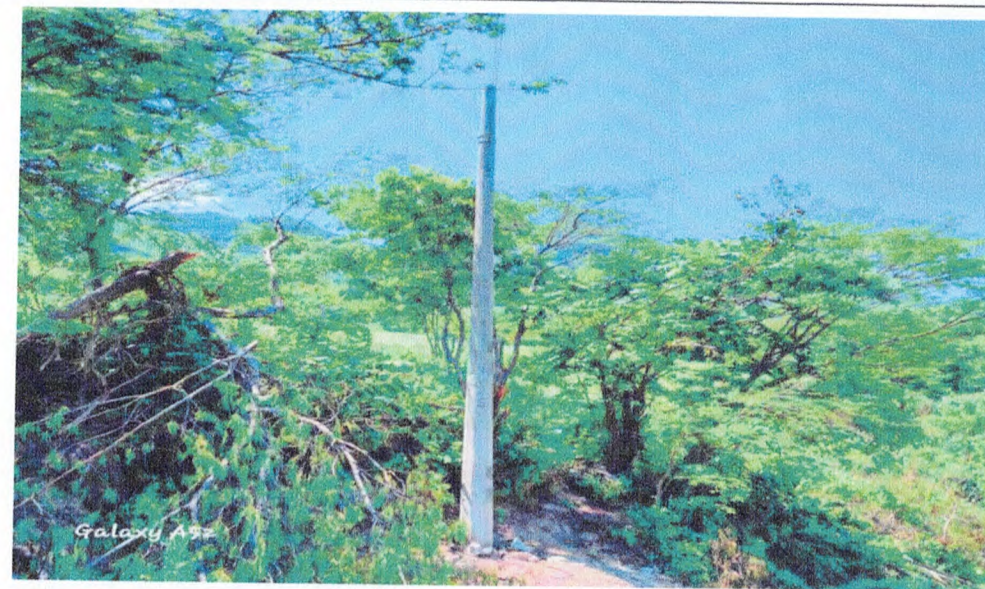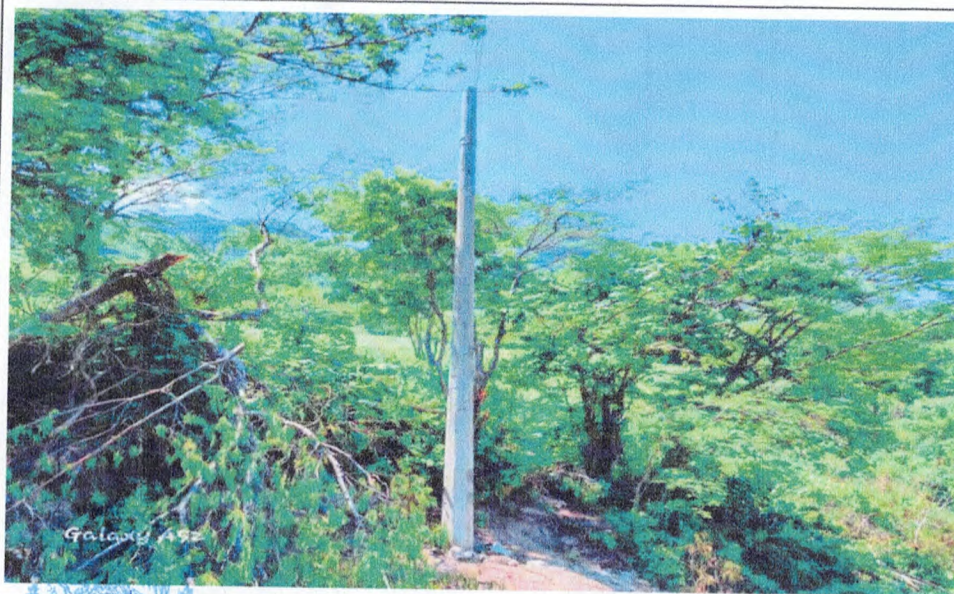

AUTORIZO:
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Santa Maria Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

Vo.Bo.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. ALDA NELI GONZALEZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

REVISO:
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS

EMPRESA:
ING. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
PERSONA FÍSICA
RFC: LOOJ700716KG1
C. TEHUANTEPEC # 112, COL. SAN ANTONIO
CD. IXTEPEC, OAXACA, C.P. 70110
TEL. 971 137 41 76 | correo: jlopez@hatmail.com

ELABORÓ:
ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

TESORERÍA MUNICIPAL
Santa Maria Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Santa Maria Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.		Monto Contratado: \$ 490,000.00	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
		Monto del Anticipo: \$ 147,000.00	R.F.C.: LOOJ700716KG1
		Monto del Convenio:	Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110
		Total Contratado: \$ 490,000.00	Teléfono: 971 137 41 76 Tel. Fax:
		Estimación Numero: 01 (UNO)	Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
		Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	Núm. De Hoja: 17 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.		
A05	CONDUCTORES	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
A05-1	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR 3/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MI.




AUTORIZO: G. VALERIO SALVADOR ANTONIL PRESIDENTE MUNICIPAL Guienagati, Dtto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	AUTORIZO: C. DAVID PEREZ ESCOBAR SINDICO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	C. ALDA NELI QUIRÓZ PEREZ TESORERA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL Santa María Guienagati, Dtto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ REGIDOR DE OBRAS REGIDURÍA DE OBRAS Santa María Guienagati, Dtto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025
ELABORÓ: ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA CEDULA-7301769			
EMPRESA: JAIME LOPEZ ORDOÑES PERSONA FÍSICA RFC: LOOJ700716KG1 C. TEHUANTEPEC, COL. BARRIO SAN ANTONIO C. JAIME LOPEZ ORDOÑES CD. IXTEPEC, OAX. C.P. 70110 PERSONA FÍSICA TEL. 971 137 41 76 correo: jaime@hotmail.com			

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.	Monto Contratado: \$ 490,000.00 Monto del Anticipo: \$ 147,000.00 Monto del Convenio: Total Contratado: \$ 490,000.00 Estimación Numero: 01 (UNO)	Contratista: C. JAI ME LÓPEZ ORDOÑES R.F.C.: LOOJ700716KG1 Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA, C.P. 70110 Teléfono: 971 137 41 76 Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
Localidad: PASO LIMON Municipio: SANTA MARIA GUIENAGATI Estado: OAXACA	Recurso: RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	Tel. Fax: Núm. De Hoja: 18 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 - JULIO - 2023 AL 22 - AGOSTO - 2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		
A05	CONDUCTORES	UNIDAD
CLAVE	CONCEPTO	
A05-2	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR 1/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MI.

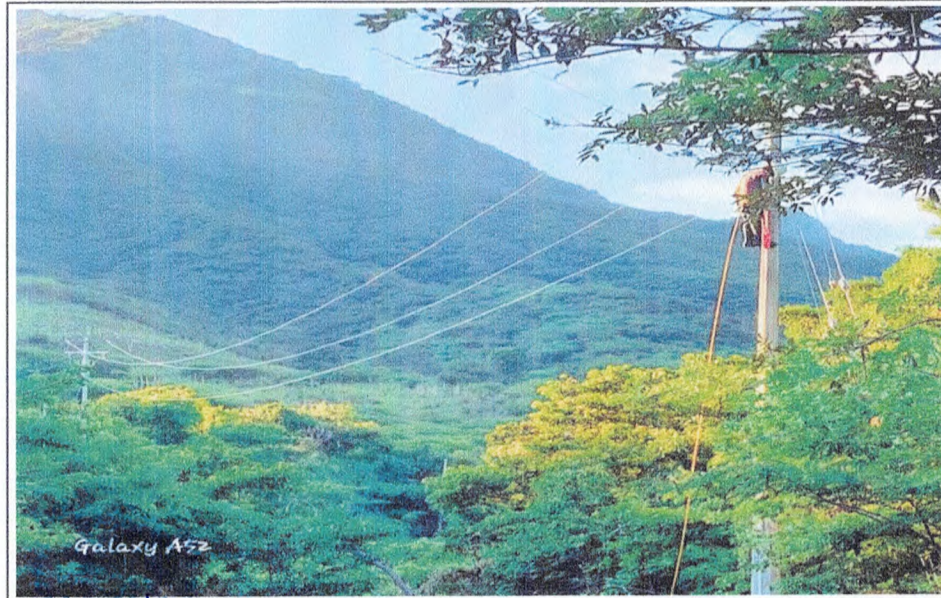

AUTORIZO:

C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. ALDA NELI GUZMAN PEREZ
TESORERA MUNICIPAL

ELABORÓ:

ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REVISO:

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS
REGIDURÍA DE
OBRAS
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

EMPRESA:
JAI ME LOPEZ ORDOÑES
PERSONA FÍSICA
R.F.C.: LOOJ700716KG1
C. JAI ME LÓPEZ ORDOÑES
C. TEHUANTEPEC # 112 BARRIO SAN ANTONIO
CD. IXTEPEC, OAX. C. P. 70110
TEL 971 137 41 76 | cgolfo_jaime@hotmail.com

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.	Monto Contratado: \$ 490,000.00 Monto del Anticipo: \$ 147,000.00 Monto del Convenio: Total Contratado: \$ 490,000.00 Estimación Numero: 01 (UNO)	Contratista: C. JAI ME LÓPEZ ORDOÑES R.F.C.: LOOJ700716KG1 Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA, C.P. 70110 Teléfono: 971 137 41 76 Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
Localidad: PASO LIMON Municipio: SANTA MARIA GUIENAGATI Estado: OAXACA	Recurso: RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	Tel. Fax: Núm. De Hoja: 18 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 - JULIO - 2023 AL 22 - AGOSTO - 2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTRICA EN PASO LIMON.		
A05	CONDUCTORES	UNIDAD
CLAVE	CONCEPTO	
A05-2	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR 1/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	MI.



AUTORIZO: C. VALERIO SALVADOR ANTONIL PRESIDENTE MUNICIPAL Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	AUTORIZO: C. DAVID PEREZ ESCOBAR SINDICO MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL Santa María Guienagati, Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	TESORERÍA MUNICIPAL Santa María Guienagati, Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025	ELABORÓ: ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ RESIDENTE DE OBRA CEDULA-7301769	REVISO: C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ REGIDOR DE OBRAS	REGIDURÍA DE OBRAS Santa María Guienagati, Dpto. Tehuantepec, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025
--	--	--	--	---	---	---

EMPRESA:

JAI ME LOPEZ ORDOÑES

PERSONA FÍSICA

RFC: LOOJ700716KG1

C. TEHUANTEPEC # 112 BARRIO SAN ANTONIO

CD. IXTEPEC, OAX. C. P. 70110

TEL 971 137 41 76 | cgolfo_jaime@hotmail.com

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.		Monto Contratado: \$ 490,000.00	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
		Monto del Anticipo: \$ 147,000.00	R.F.C.: LOOJ700716KG1
		Monto del Convenio:	Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110
		Total Contratado: \$ 490,000.00	Teléfono: 971 137 41 76 Tel. Fax:
		Estimación Numero: 01 (UNO)	Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023			Núm. De Hoja: 19 DE 19

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.		
A06	TRANSFORMADORES	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
A06-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 1TDA2-10 KVA-13200-120/240 V.), INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.



AUTORIZO:

C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL



AUTORIZO:

C. ALDA NELI QUIROZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL



REVISO:

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS



EMPRESA
JAIME LOPEZ ORDOÑES
PERSONA FÍSICA
R.F.C.: LOOJ700716KG1
C. TEHUANTEPEC # 112 BARRIO SAN ANTONIO
CD. IXTEPEC, OAX. C.P. 70110
TEL. 971 137 41 76 | cgalfo_jaime@hotmail.com

SINDICATURA
MUNICIPAL
Santa María
Guianagati,
Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

ELABORÓ:

ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

TESORERÍA
MUNICIPAL
Santa María
Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE
OBRAS
Santa María
Guianagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

Obra: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.		Monto Contratado: \$ 490,000.00	Contratista: C. JAIME LÓPEZ ORDOÑES
		Monto del Anticipo: \$ 147,000.00	R.F.C.: LOOJ700716KG1
		Monto del Convenio:	Domicilio: CALLE TEHUANTEPEC NUM. 112, COL. SAN ANTONIO, CIUDAD IXTEPEC, OAXACA. C.P. 70110
		Total Contratado: \$ 490,000.00	Teléfono: 971 137 41 76 Tel. Fax:
		Estimación Numero: 01 (UNO)	Fecha de Elaboración: 08 DE AGOSTO DE 2023
Recurso:		Periodo de Ejecución: 24 DE JULIO DE 2023 AL 07 DE AGOSTO DE 2023	Núm. De Hoja: 19 DE 19
Localidad: PASO LIMON	RAMO GENERAL 33 - FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		
Municipio: SANTA MARIA GUIENAGATI			
Estado: OAXACA			

Numero de Contrato: MSMG/FAISMUN/001/2023	De Fecha: 22 DE JULIO DE 2023	Periodo de Contrato: 24 -JULIO-2023 AL 22 -AGOSTO-2023
Numero de Convenio de Diferimiento:	De Fecha:	Periodo de Conv. De Diferimiento:
Numero de Convenio Modificatorio:	De Fecha:	Periodo de Convenio Modificatorio:

AMPLIACION DE LA RED ENERGIA DE ELECTICA EN PASO LIMON.		
A06	TRANSFORMADORES	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD
A06-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 1TDA2-10 KVA-13200-120/240 V.), INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	Pza.



AUTORIZO:

C. VALERIO SALVADOR ANTONIL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

AUTORIZO:

C. DAVID PEREZ ESCOBAR
SINDICO MUNICIPAL



AUTORIZO:

C. ALDA NELI QUIROZ PEREZ
TESORERA MUNICIPAL



REVISO:

C. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ
REGIDOR DE OBRAS



EMPRESA
JAIME LOPEZ ORDOÑES
PERSONA FÍSICA
R.F.C.: LOOJ700716KG1
C. TEHUANTEPEC # 112 BARRIO SAN ANTONIO
CD. IXTEPEC, OAX. C.P. 70110
TEL. 971 137 41 76 | cgalfo_jaime@hotmail.com

SINDICATURA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

ELABORÓ:

ING. BASILIO CHARIS SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CEDULA-7301769

TESORERÍA
MUNICIPAL
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA DE
OBRAS
Santa María
Guienagati,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025
